IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI SAN SEVERO

FASE -01-
SCALA 1:50

A. PRESCAVO FINO A Q.ta +68.50M
B. INFISSIONE PARATIA DI PALANCOLE

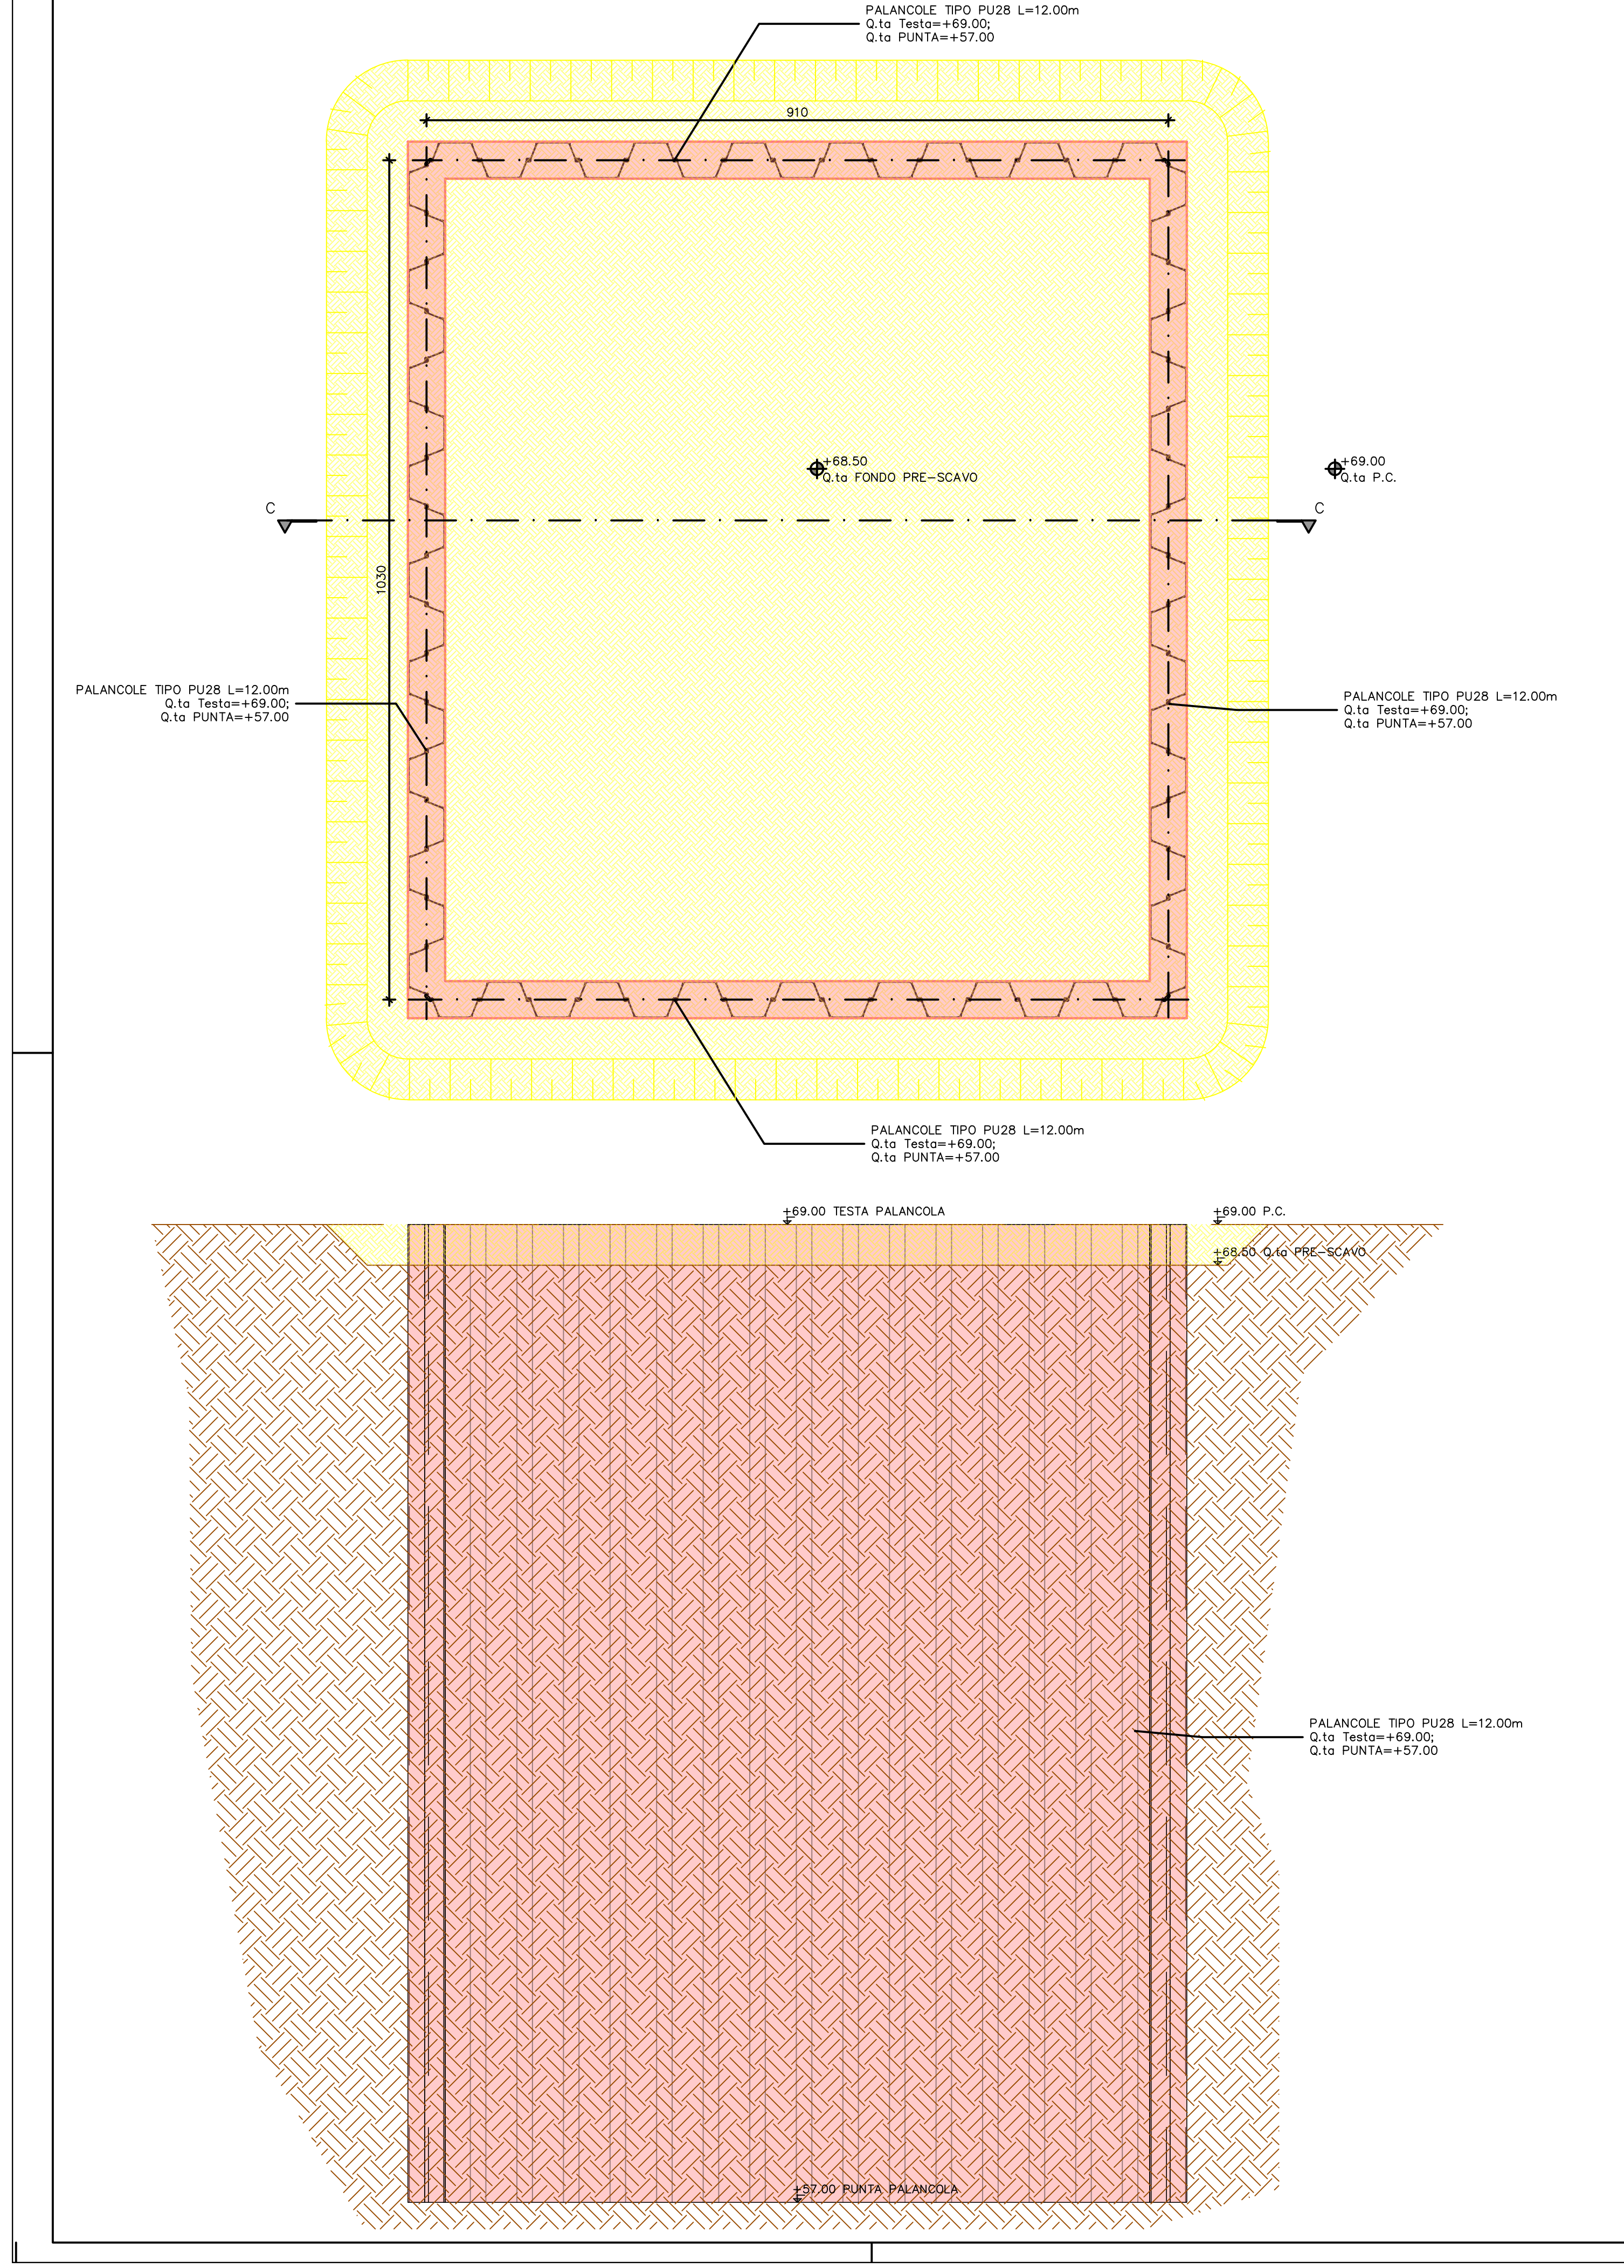
PALANCOLE TIPO PU28 L=12.00m
Q.ta Testa=+69.00;
Q.ta PUNTA=+57.00
910
1030
+68.50
Q.ta FONDO PRE-SCAVO
+69.00
Q.ta P.C.
C
+69.00 TESTA PALANCOLA
+69.00 P.C.
+68.50 Q.ta PRE-SCAVO

FASE -02-
SCALA 1:50

A. SCAVO FINO A Q.ta +66.00M
B. POSA DI TRAVI DI RIPARTIZIONE E PUNTELLI

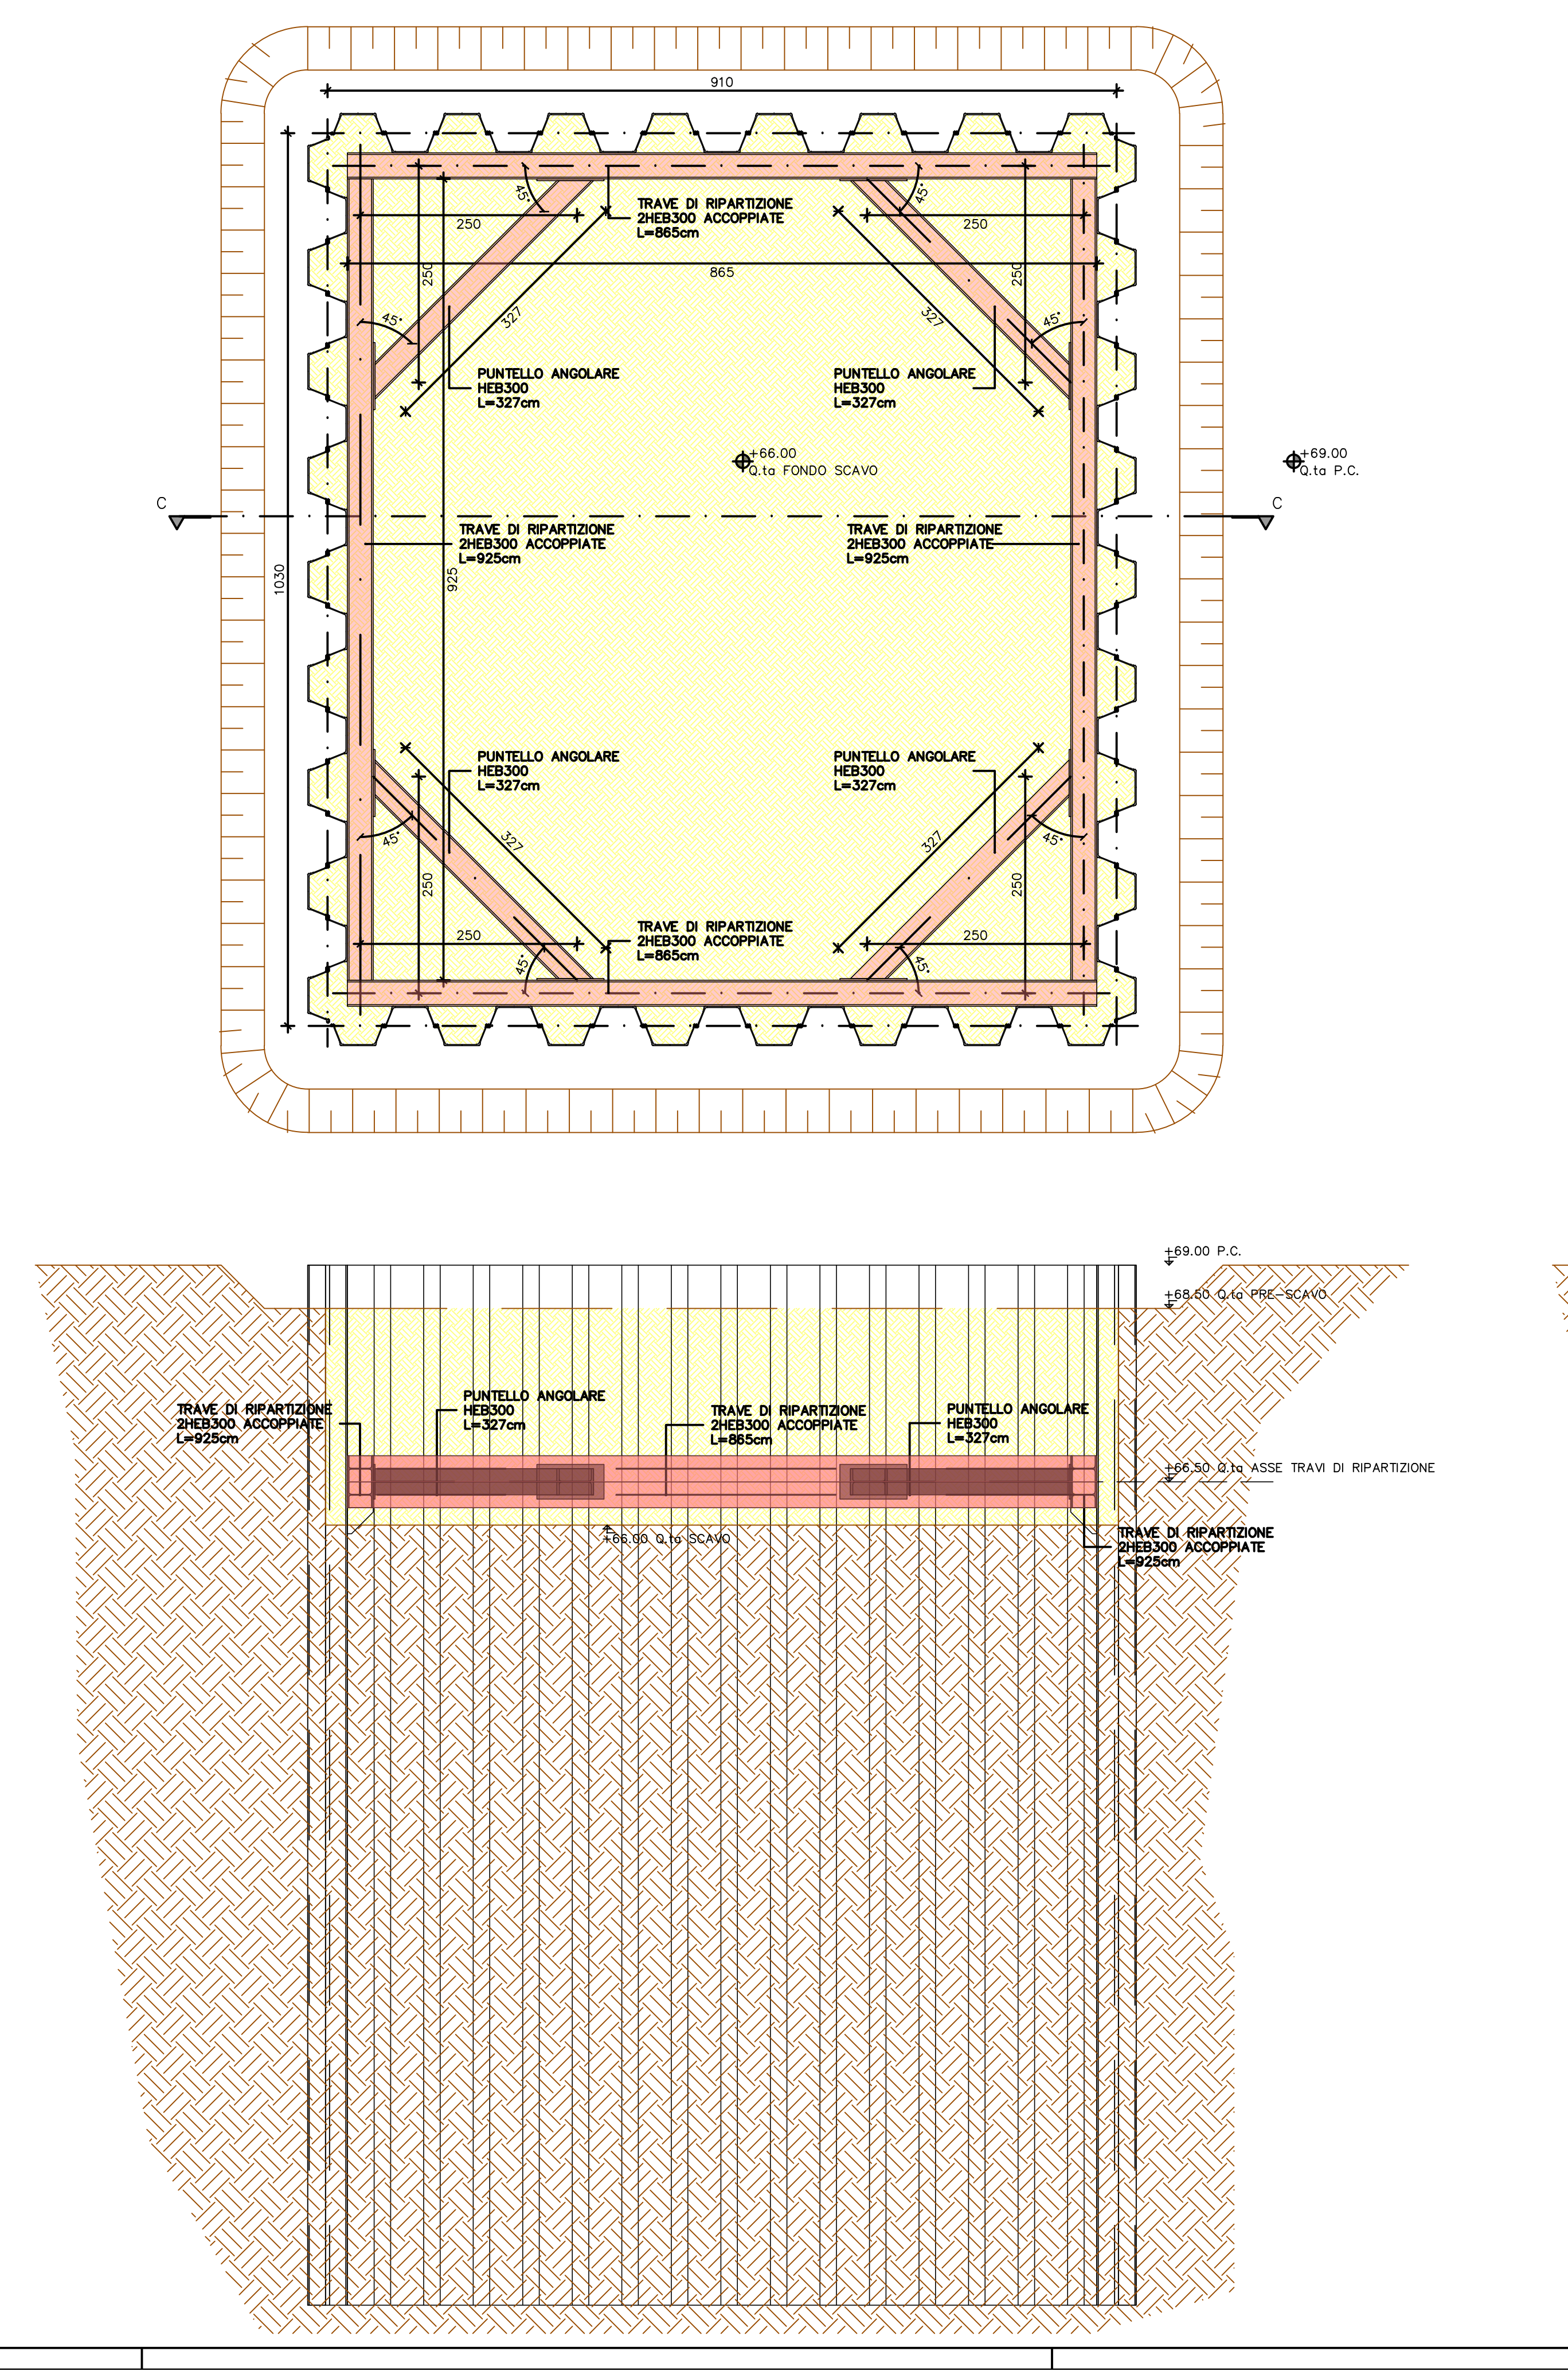
910
865
1030
925
250
327
45°
TRAVE DI RIPARTIZIONE
2HEB300 ACCOPPIATE
L=865cm
TRAVE DI RIPARTIZIONE
2HEB300 ACCOPPIATE
L=925cm
PUNTELLO ANGOLARE
HEB300
L=327cm
+66.00
Q.ta FONDO SCAVO
+69.00
Q.ta P.C.
C

FASE -03-
SCALA 1:50

A. SAGOMATURA DEL FONDO SCAVO SECONDO LE QUOTE DI PROGETTO
+63.80, +63.15, +62.35
B. GETTO MAGRONE DI FONDAZIONE

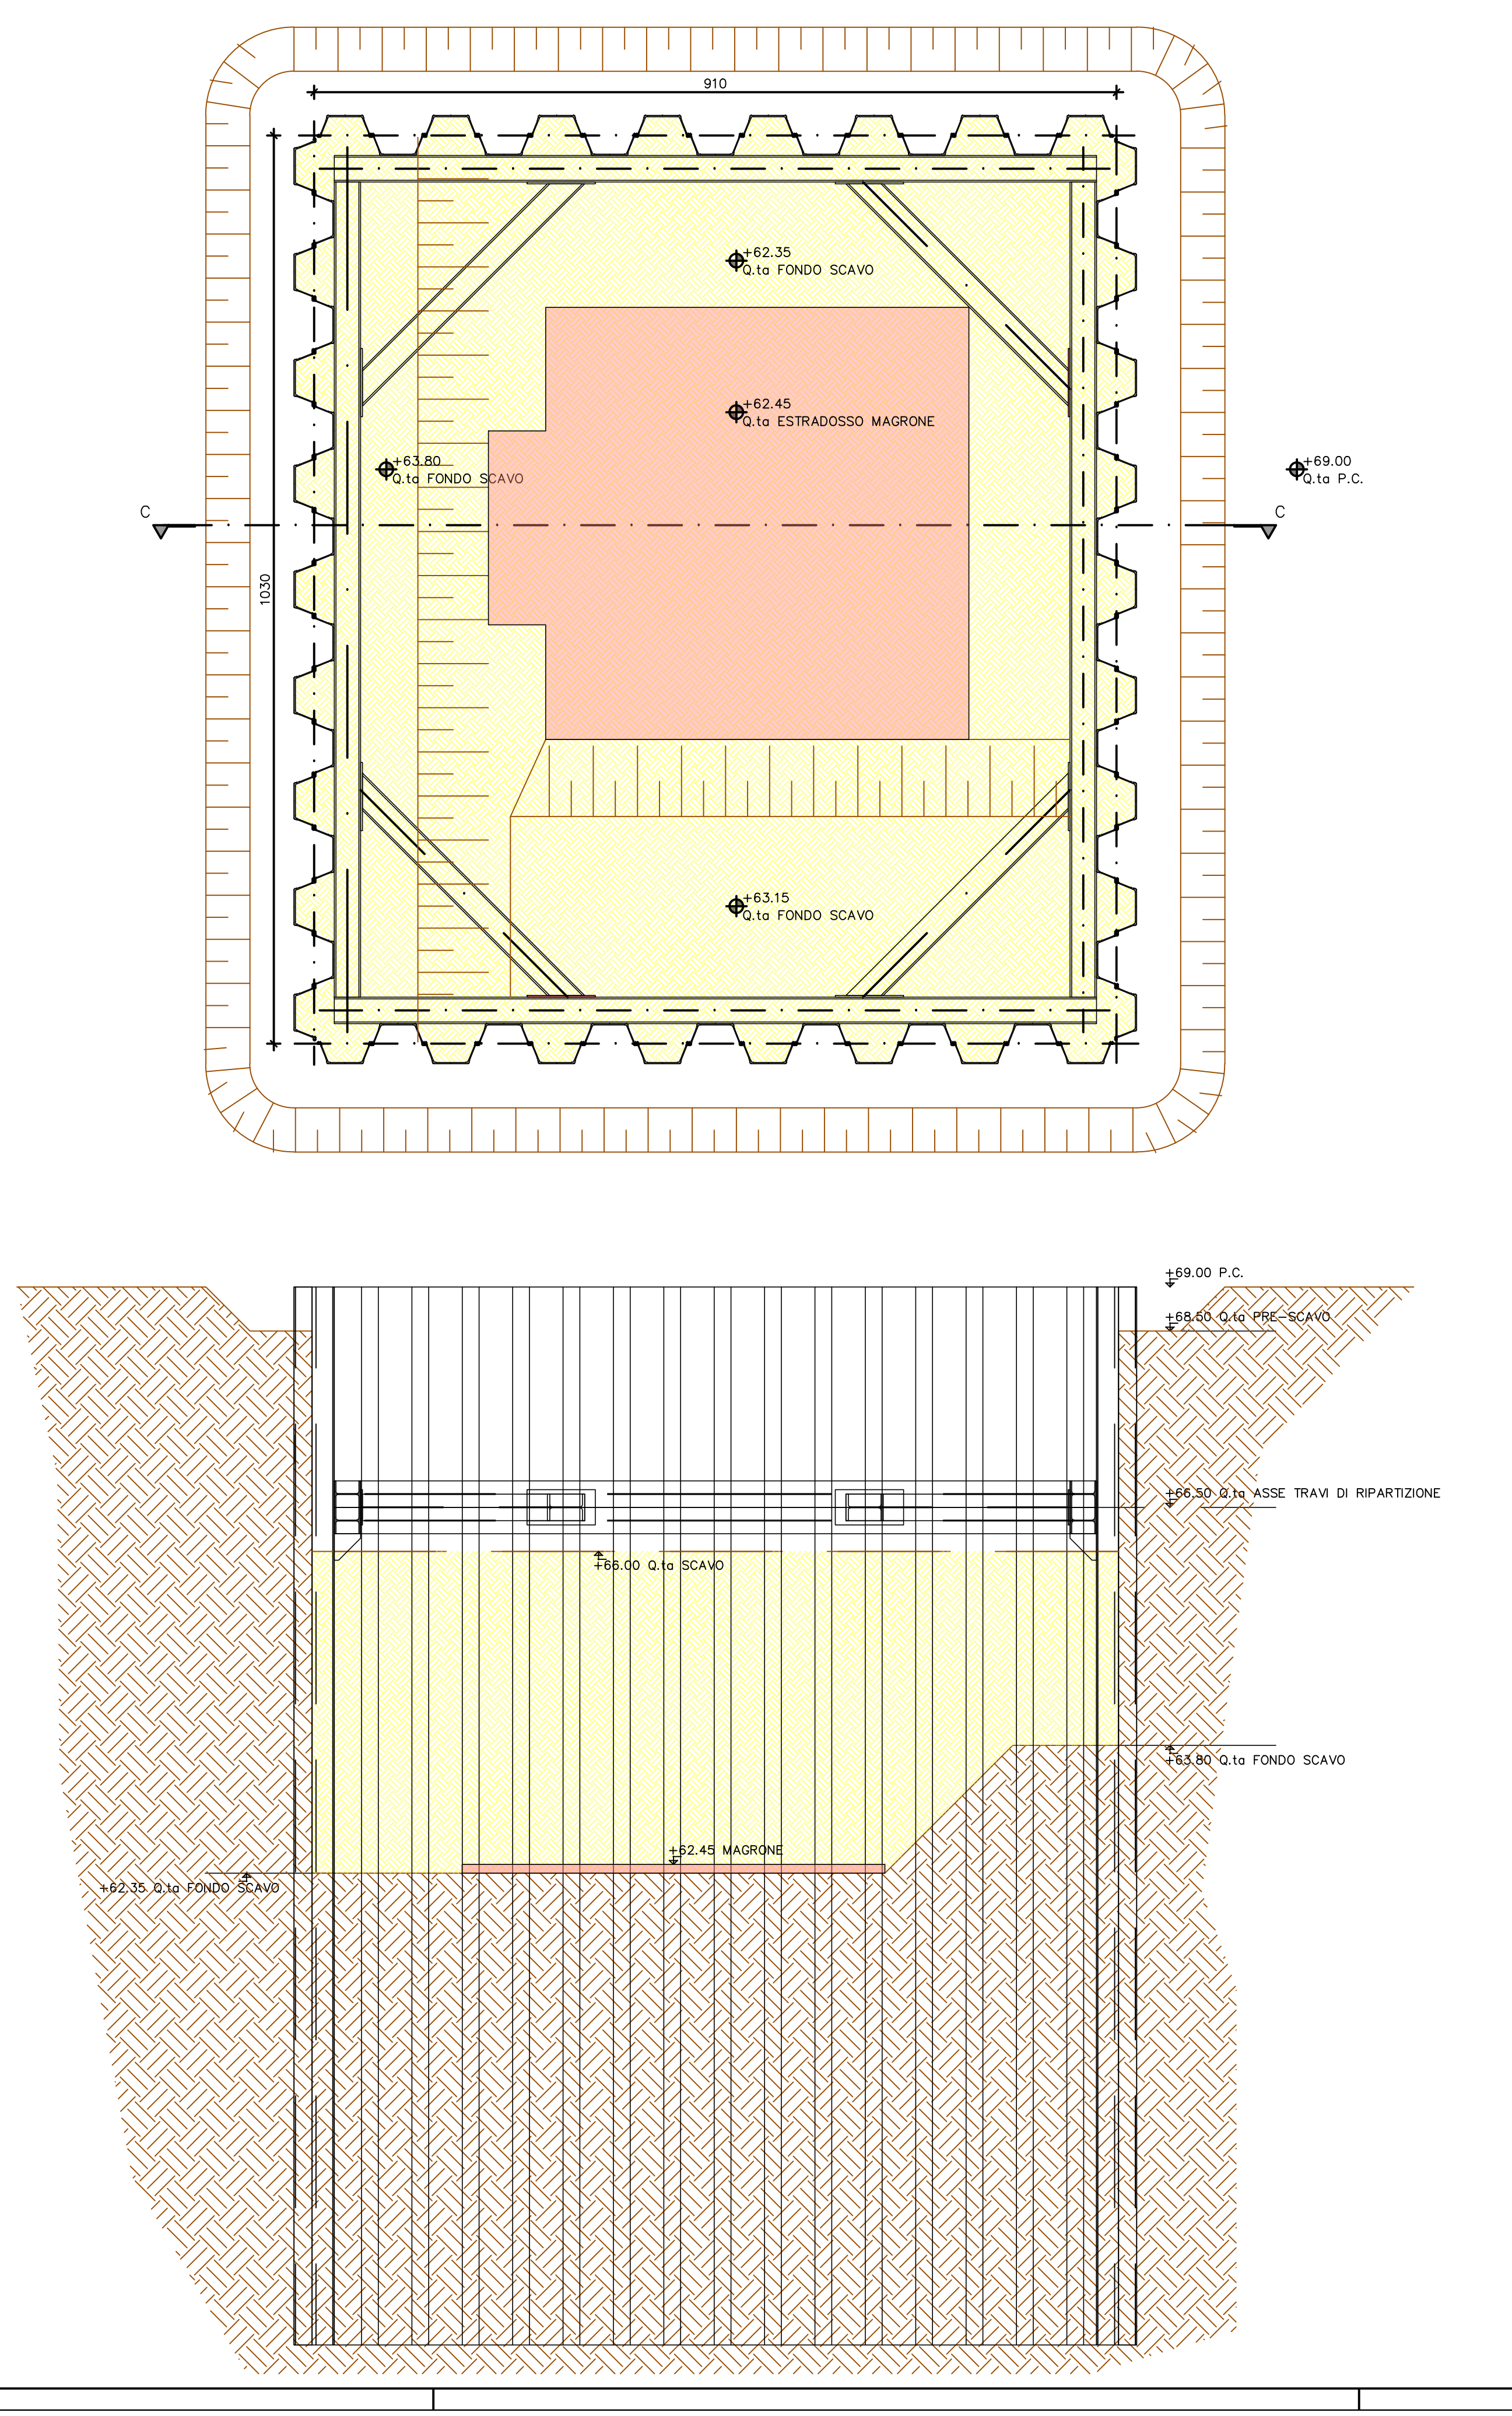
910
1030
+62.35
Q.ta FONDO SCAVO
+62.45
Q.ta ESTRADOSSO MAGRONE
+63.80
Q.ta FONDO SCAVO
+63.15
Q.ta FONDO SCAVO
+69.00
Q.ta P.C.
C

FASE -04-
SCALA 1:50

A. REALIZZAZIONE DELL'OPERA
B. REINTERRO PARZIALE FINO ALLA QUOTA +66.00

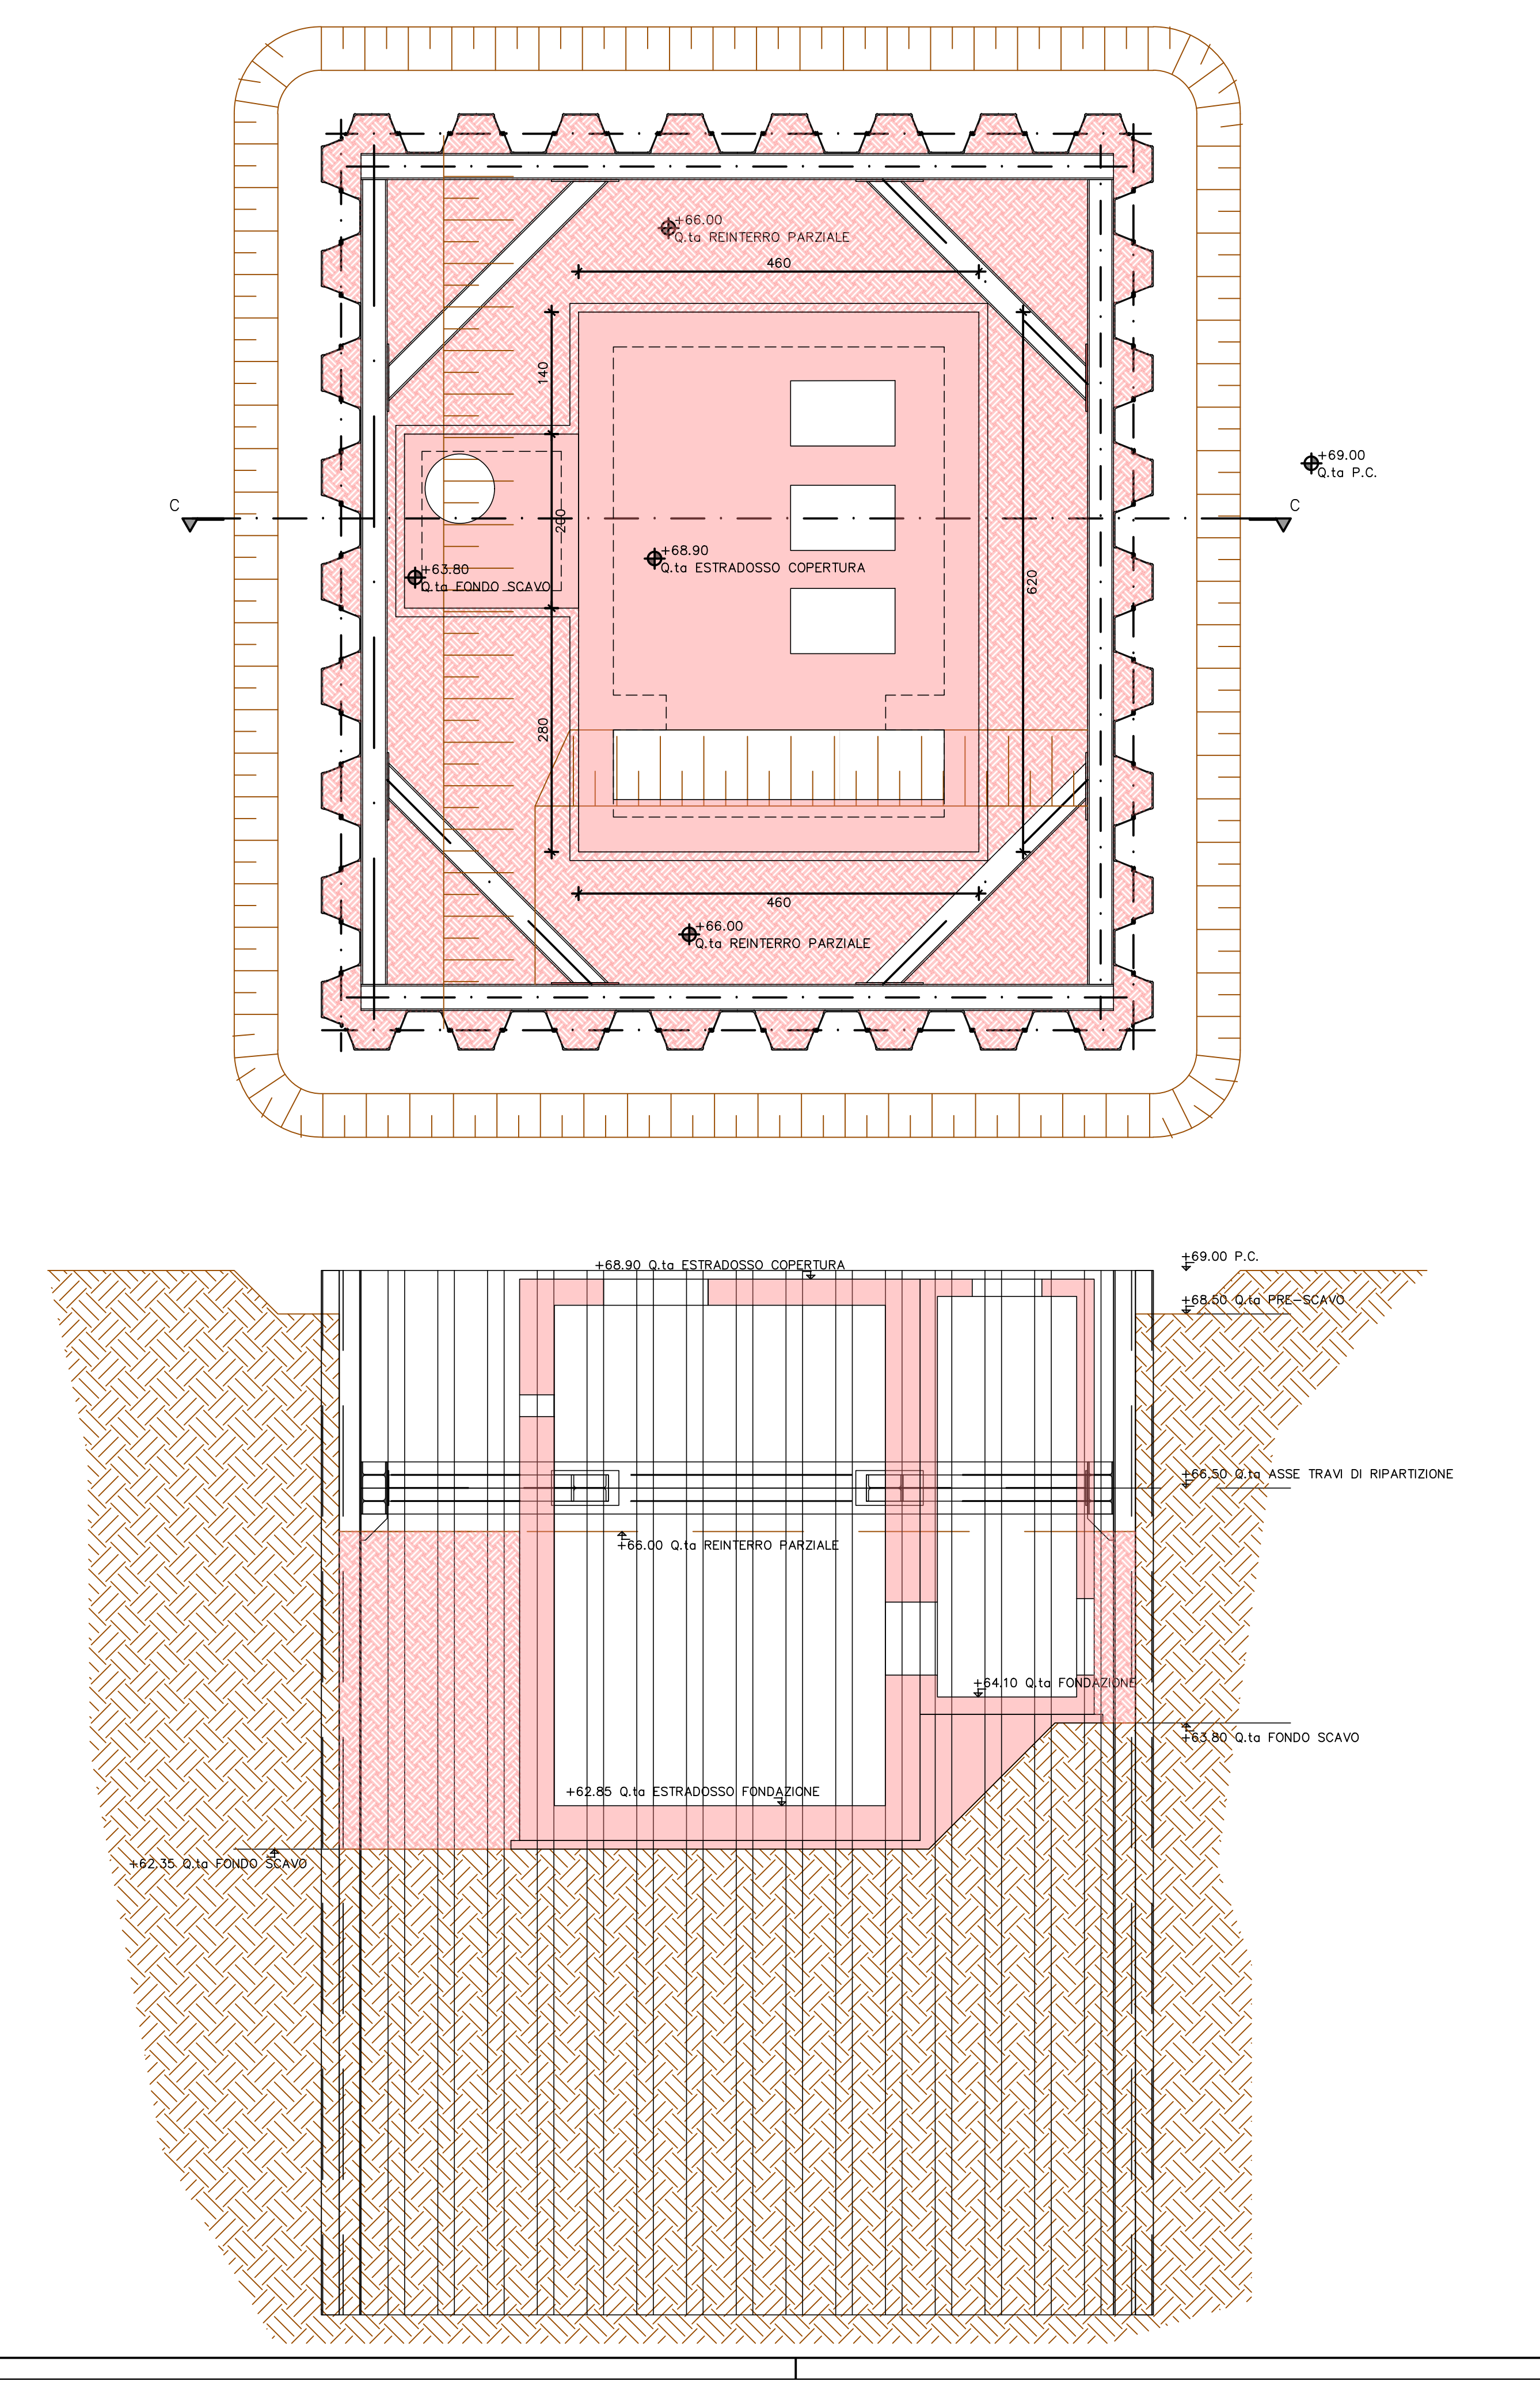
+66.00
Q.ta REINTERRO PARZIALE
460
140
260
280
620
+63.80
Q.ta FONDO SCAVO
+68.90
Q.ta ESTRADOSSO COPERTURA
+69.00
Q.ta P.C.
C

FASE -05-
SCALA 1:50

A. RIMOZIONE DI PUNTELLI E TRAVI DI RIPARTIZIONE
B. REINTERRO FINO ALLA QUOTA +68.50

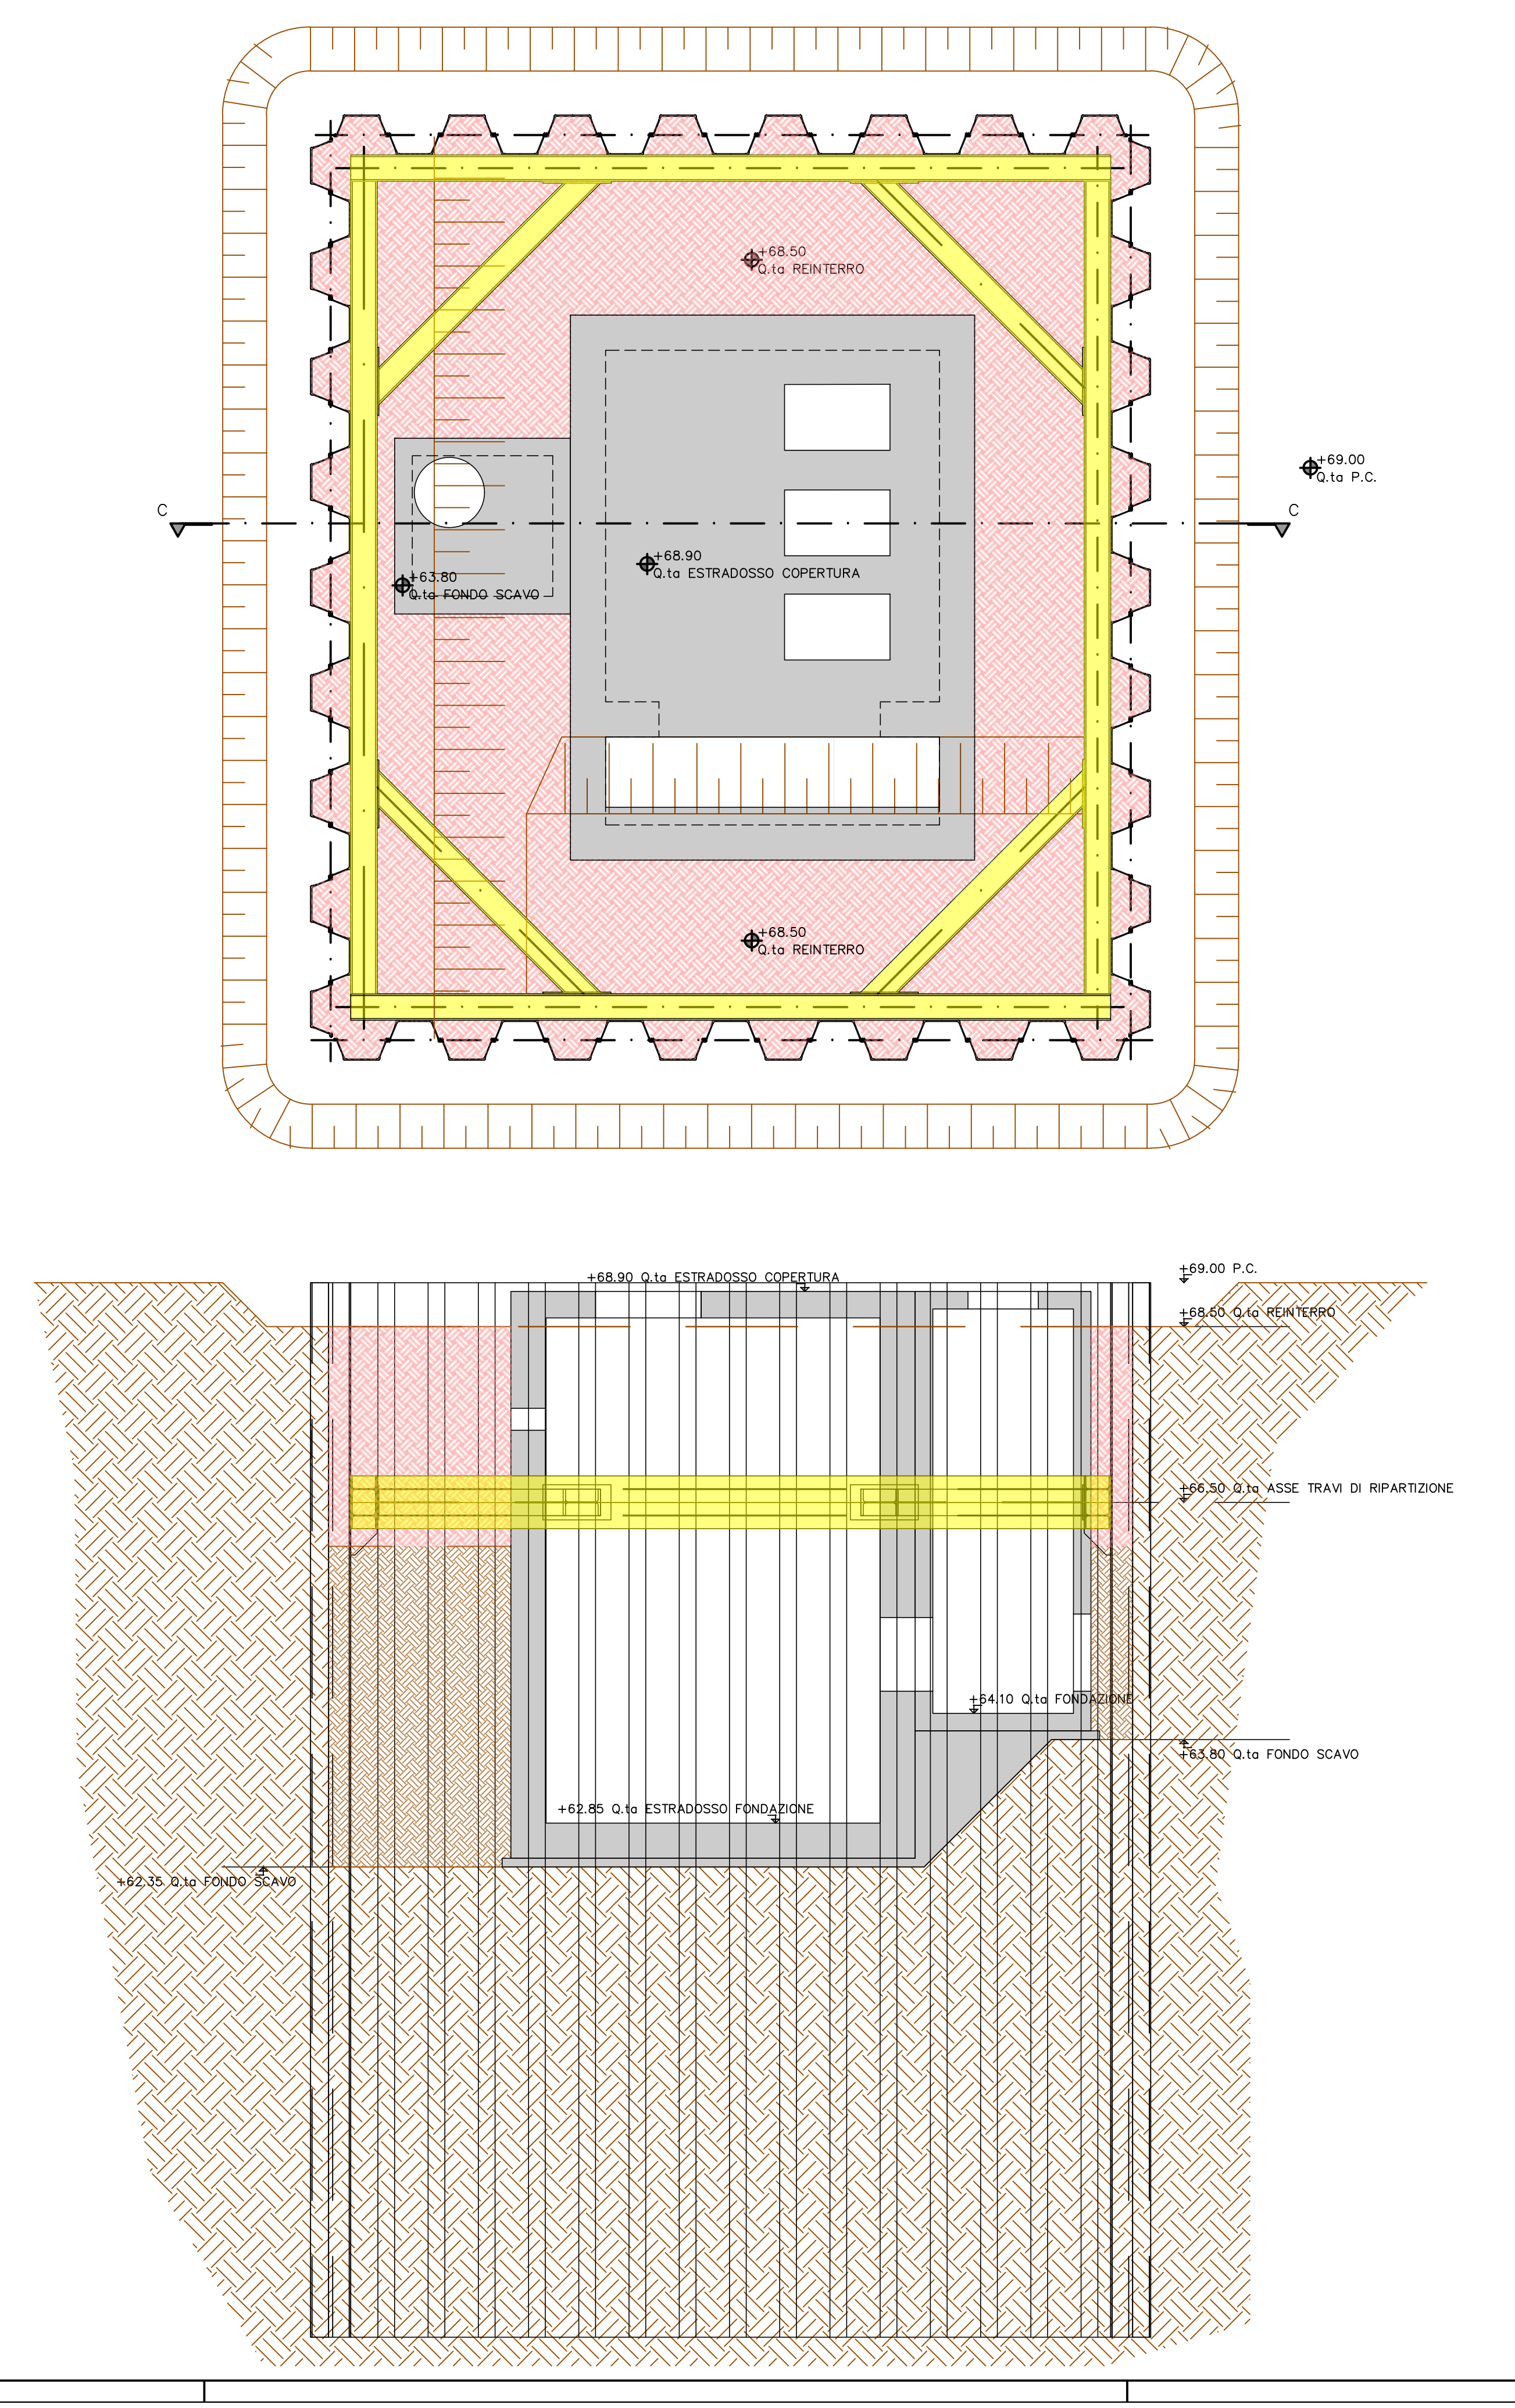

FASE -06-
SCALA 1:50

A. RIMOZIONE PALANCOLE
B. REINTERRO FINO ALLA QUOTA DEL PIANO DI CAMPAGNA +69.00

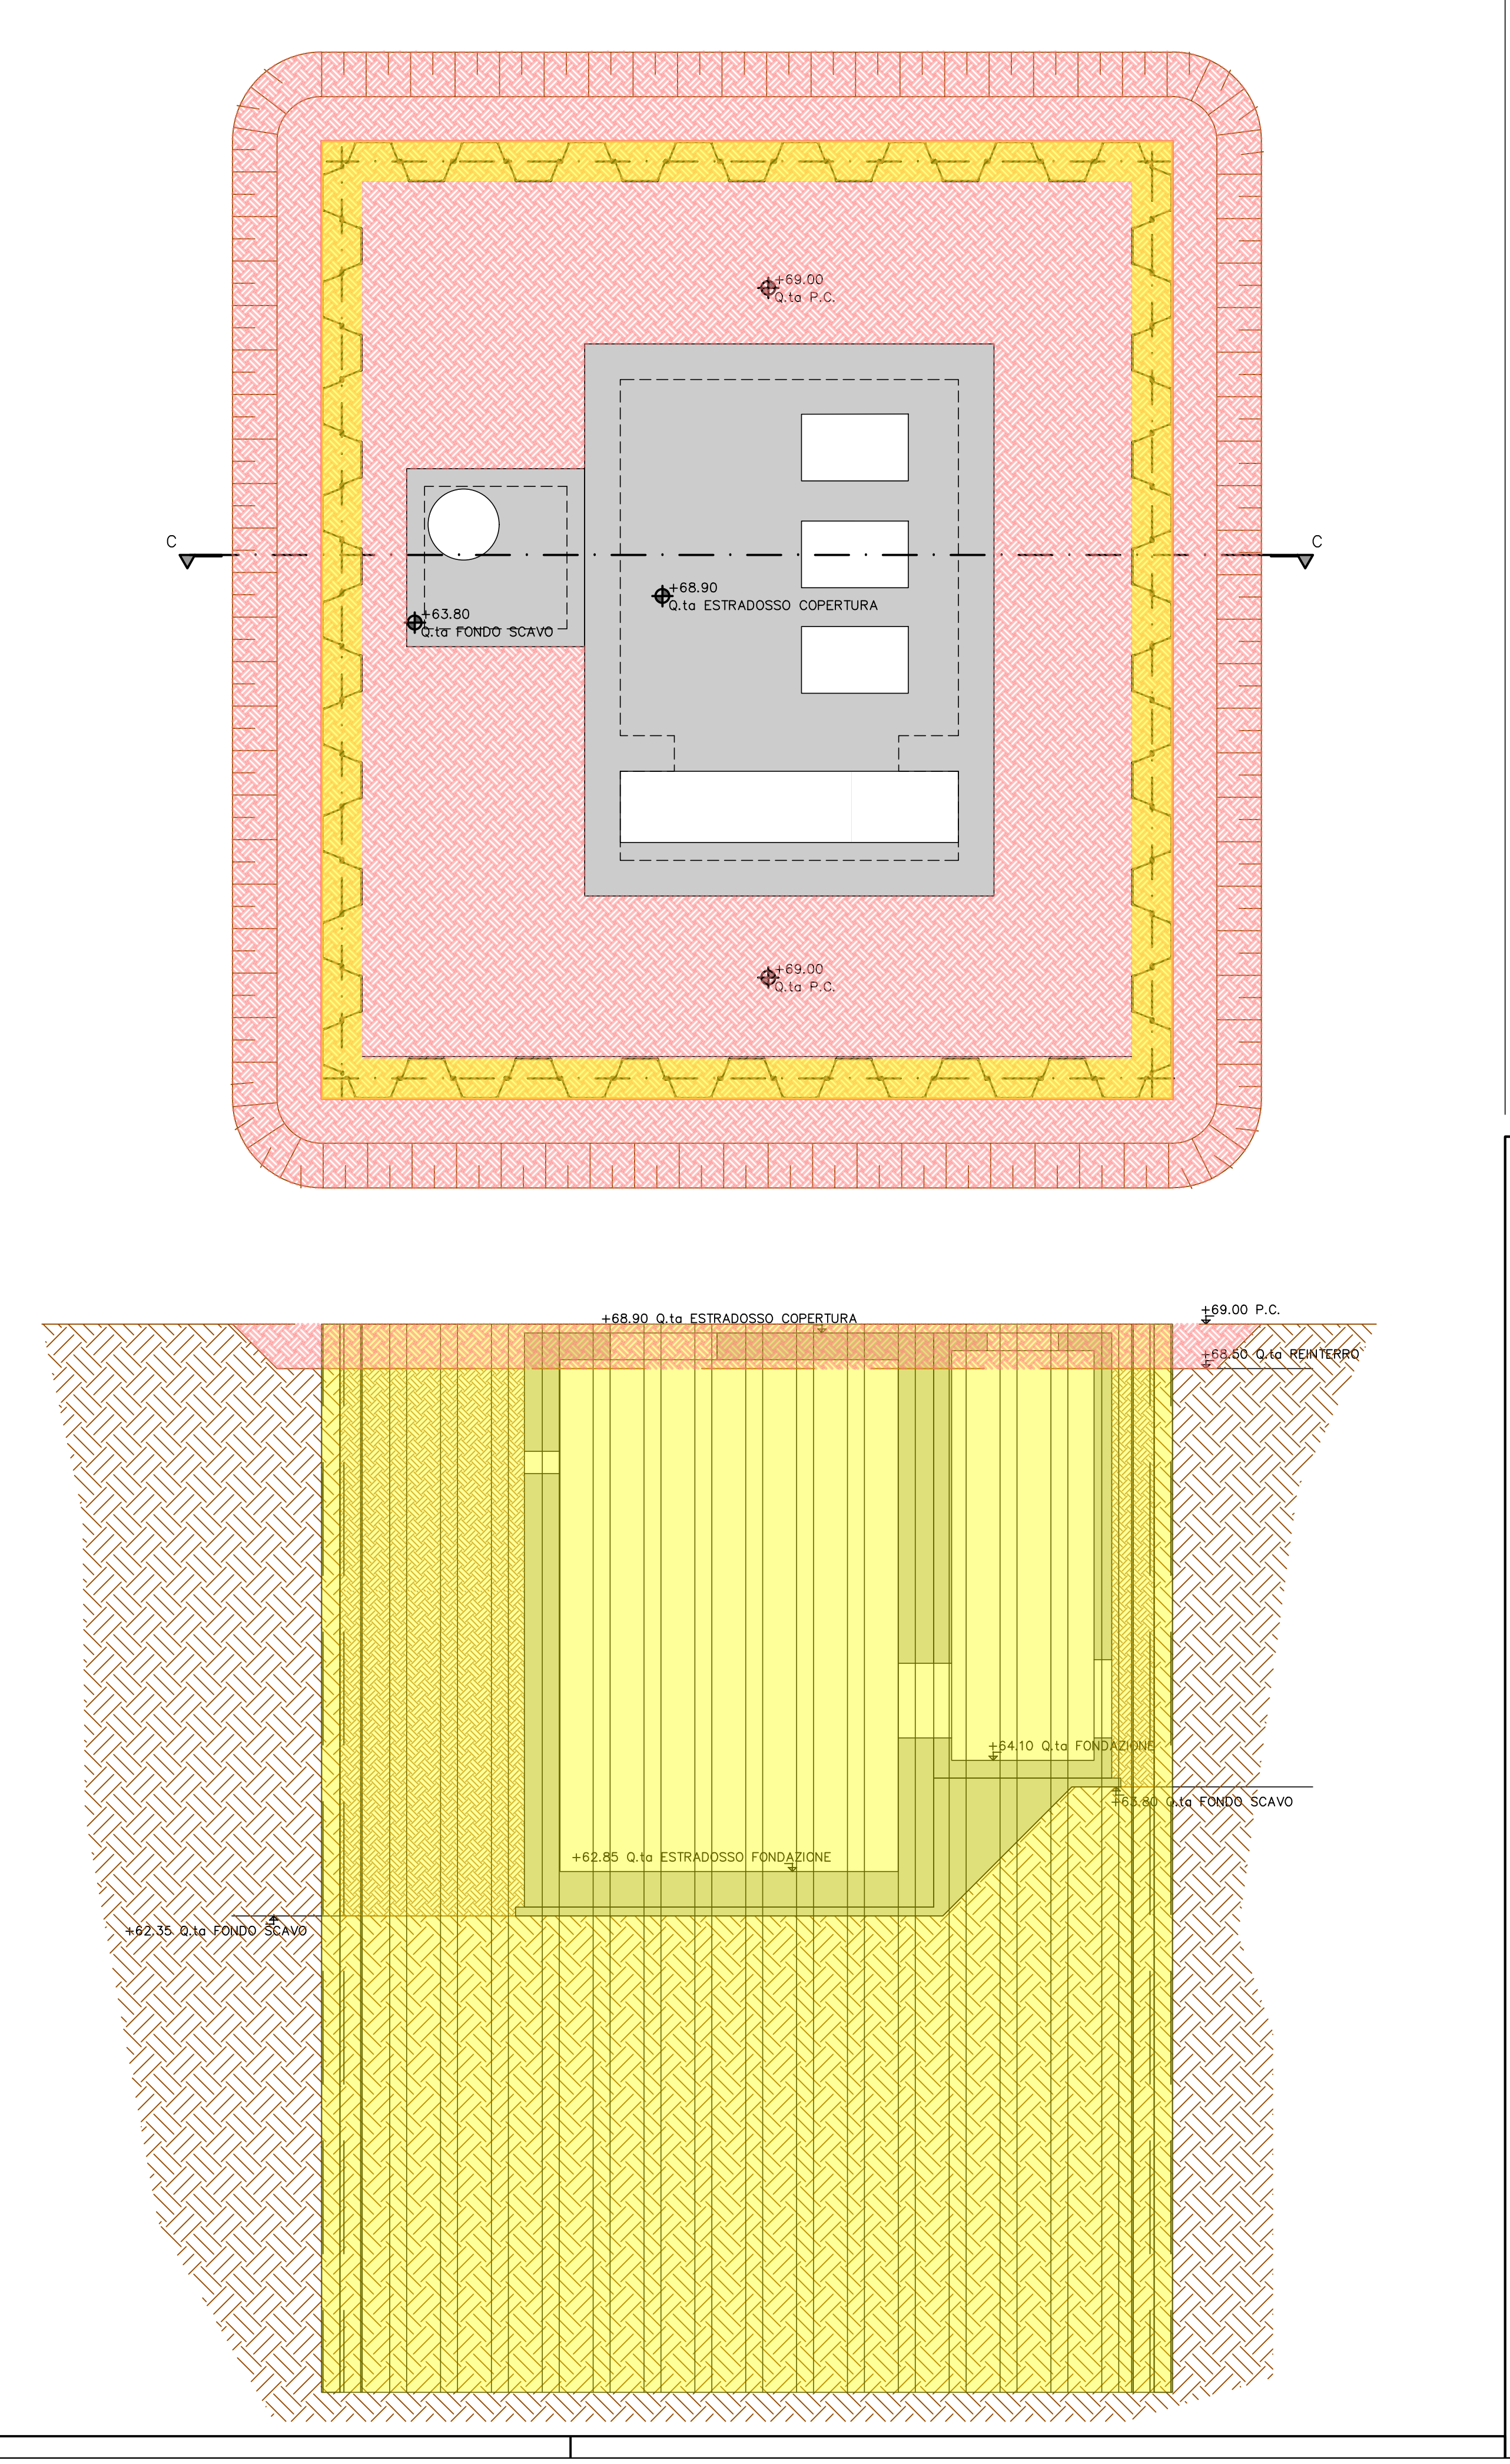

TABELLA MATERIALI

ACCIAIO

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA
(travi di ripartizione, puntelli, piastrame, etc...)

TIPO S355 (t≤40mm):
- Resistenza caratteristica a snervamento: fyk > 355 MPa
- Resistenza caratteristica a rottura: ftk > 510 MPa

ACCIAIO PER PALANCOLE

TIPO S355GP (t≤40mm):
- Resistenza caratteristica a snervamento: fyk > 355 MPa
- Resistenza caratteristica a rottura: ftk > 480 MPa

ACCIAIO PER C.A.
Rif. DM 17/01/2018

TIPO B450C saldabile:
- Resistenza caratteristica a snervamento: fyk > 450 MPa
- Resistenza caratteristica a rottura: ftk > 540 MPa

- Collegamento di barre d'armatura post-installate (inghisaggio):
Impiegare ancorante chimico epossidico ad alte prestazioni tipo Hilti HIT-RE 500 v4 o equivalente secondo indicazioni del fornitore

CALCESTRUZZO

CALCESTRUZZO MAGRO
E GETTI DI LIVELLAMENTO

- CLASSE DI RESISTENZA MINIMA: C12/15
- CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE: X0

CALCESTRUZZO PER OPERE DEFINITIVE
Rif. UNI EN 206

- CLASSE DI CONSISTENZA: S5
- CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE: XC4+XA2
- RAPPORTO MASSIMO a/c: 0.5
- CONTENUTO DI CLORURI: Cl<0.4
- DIAMETRO MASSIMO DEGLI INERTI: D_{max}=25mm
- CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI
- CLASSE DI RESISTENZA MINIMA: C32/40
- COPRIFERRO NOMINALE: 40 mm

SALDATURE

- TUTTE LE SALDATURE A CORDONE D'ANGOLO DOVRANNO AVERE SPESSORE DI GOLA MAGGIORE O UGUALE A 0,7 VOLTE LO SPESSORE MINIMO DA SALDARE.
- PER LA SALDATURA AD ARCO MANUALE DEVONO ESSERE IMPIEGATI ELOTTRODI RIVESTITI OMOLOGATI SECONDO UNI EN ISO 2560, SECONDO QUANTO PREVISTO AL 11.3.4.5 DELLE NTC 2018.
- SALDATURE DI PRIMA CLASSE PER GIUNTO A T A COMPLETA PENETRAZIONE (Dove non diversamente indicato)

PER TUTTE LE FLANGE
S1≥S2
H=0.7xS2
G=1.3xS2



- SALDATURE A CORDONE D'ANGOLO (Dove non diversamente indicato)

S1≥S2
H=S2
G=0.7xS2



AZIENDA GARDESANA SERVIZI

"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI REFLUI NEL BACINO DEL LAGO DI GARDA - SPONDA VERONESE"
Lotto 1 - Tratto 4 - 2°Stralcio
"OPERE COLLETTORE IN PRESSIONE ED OPERE COMPLEMENTARI TRATTO PERGOLANA - ROCCA VELA - COMUNE BARDOLINO"
Lotto 8 - Tratto 4_OC
CIG: B7E3B750B2 - CUP: J33F17000010002

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO:
Ing. Giovanni Battista Matteotti

COLLABORAZIONE:
Ing. Luca Petracin
Ing. Andrea Martinello
Ing. Emanuele Anderlini
Ing. Filiberto Boscolo Lisetto
Geom. Elisa Zatti

mass
INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL
Via Sorio 33/a, 35141 PADOVA
Tel: 049-723320 - Mail: Info@matteotti.com

ING. G.B. MATTEOTTI

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:
Dott. Ing. Carlo Alberto Voi

TITOLO	SCALA	CODICE ELABORATO
NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI SAN SEVERO - Opere Strutturali provvisorie - Fasi esecutive	1:50	C-6-002

N° REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	Marzo 2026	PRIMA EMISSIONE		Ing. L. Petracin	Ing. G. B. Matteotti
01	Aprile 2026	AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI VERIFICA		Ing. L. Petracin	Ing. G. B. Matteotti
02	Luglio 2026	AGGIORNAMENTO POST VERIFICA AGS		Ing. L. Petracin	Ing. G. B. Matteotti
03					
04					
